Página 1 de 13 Versión 3.0

Dirección de Servicios Informáticos

Fecha de Emisión de	el Informe : 05 de Marzo del 2020	
	Mauro Tempio, Director Servicios Informáticos	Manfredo Molina, Jefe Unidad de Desarrollo
Responsables de la Información:	Sara Castillo, Jefe Unidad de Gestión Sistemas Administrativos	José Comas, Jefe Unidad de Gestión Sistemas Académicos Estudiantiles
	René Melo, Jefe Unidad de PT	Mónica Román, Especialista Mejoramiento Continuo

1. PROGRAMA DE PROYECTOS IE20 - PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS UCSC

1.1. PROYECTOS GRANDES - EN EJECUCIÓN.

Pr	oyectos:			Origen	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
		Sistema de apoyo a la Gestión VRVM	Etapa 1: Construcción indicadores para VRVM.	PDE		Oseguel Smendoza	Ene-19	Dic-19	98%
1	M001	(\$9.470.000)	Etapa 2: Sistematización de las actividades de la VRVM.	VRVM	Desarrollo	Mmolina Amora	Ene-20	Por definir	
		Modernización de	Portal de compras SENEGOCIA (Compra y Documentación Tributaria Electrónica).		GSA	Xsagredo Scastillo Jcabezas	Ago-18	Ene-20	92%
2	M004	sistema apoyo gestión área financiero contable	Formulación presupuestaria por actividades.	PDE DF		Jrivera Mcisternas	Feb-19	Nov-19	100%
		(\$119.659.000)	Sistema de apoyo a la gestión financiera contable.		Desarrollo	Cdellarossa Mmolina Asilva	Sep-19	Dic-20	15%
		Modernización de sistema apoyo gestión área	Adecuación Sistema Académico (SISCON). (\$46.550.288)	PDE		Aibarra Amora	Sep-19	Dic-20	14%
3	M028	académico curricular	Adecuación Sistema Curricular (SIMBAD). (\$104.222.476)	VRA UDA	Desarrollo	Jgamonal Mmolina	Jun-19	Jun-21	29%
4	U024	Portal de Funcionarios	Plataforma que permite a todos los funcionarios de la UCSC acceder a servicios en línea prestados por la institución.	Rectoría	Desarrollo GSAE	Oseguel Asilva Smendoza Mvenegas Cdellarossa Farcos	Ene-18	sep-19	100%
5		Sistema de Remuneraciones	Adquisición e implantación del sistema Expert de ADP Payroll.	PDE DGP	GSA	IE20	Ago-19	Ene-20	39%

Dirección de Servicios Informáticos

Boletín Informativo Trimestral DSI Diciembre 2019

Página 2 de 13 Versión 3.0

1.2. PROYECTOS MEDIANOS - EN EJECUCIÓN. Fecha Estado **RRHH** Unidades Fecha Proyectos: Origen término de DSI inicio DSI estimada avance Diseñar una solución informática que permita resolver la debilidad identificada en el PMI que señala "Las Generación de **Etorres** herramientas disponibles de los Reportes que sistemas informáticos institucionales PMI Scastillo Apoye Toma de M009 Desarrollo 100% 6 Ene-19 Octr-19 **Decisiones Nivel** respecto a la gestión de recursos DF Psierra financieros dificultan la generación Directivos -Jrivera expedita de reportes para la toma de DFinanzas. decisiones en los niveles directivos." 17% M020 Sistema que permita el registro y PDE Desarrollo Sistema de Apoyo Mmolina May-19 Jun-20 a Gestión de actualización de información del Xsagredo DD CEADE (USC 1799). 1.3. PROYECTOS MENORES - EN EJECUCIÓN. Fecha Estado **RRHH** Unidades Fecha Proyectos: Origen término de DSI inicio DSI estimada avance Etapa 1: SSAT UCSC - Entrega de manera íntegra información cuantitativa y cualitativa de los estudiantes de pregrado que facilita la detección oportuna de las diversas Sistema de Jul-18 Abr-19 95% DD razones por las que un estudiante Seguimiento y Desarrollo Mmolina M022 **PACE** podría verse en riesgo de deserción. Alerta Temprana **GSAE JComas** DAE Esta información es utilizada para UCSC (PACE). derivar a una unidad de apoyo la cual es monitoreada a través del sistema.

Etapa 2: Adecuación del sistema a

requerimientos Director Docencia

Por

definir

Por


definir

Página 3 de 13 Versión 3.0

1.4. PROYECTOS -PENDIENTES

Dirección de Servicios Informáticos

Pr	oyectos			Origen	Unidades DSI	Fecha Inicio estimada	Fecha Termino estimada
10	M015	Diseño e Implementación Registro de Contratistas.	Por definir.	PDE DO	Desarrollo		
		SEYCA - Sistema Categorización	Sistema que permita registrar,	PDE			
11	M017	Académica- etapa 2	actualizar y listar la categorización	VRA	GSAE		
		Academica etapa 2	académica	UDA			
		Apoyo para Desarrollar		PDE			
12	M019	Programas con Componente on-line.	Por definir	DGP	Desarrollo		
				PDE			
13	M021	Sistema de gestión de	Por definir	CIDD	Desarrollo	Ene-20	Oct-20
		información integrada de CIDD.		DD			
14	M025	Sistema Gestión de Apoyo a Dirección de Investigación.	por definir	DII	Desarrollo		
15	M026	Sistema de Apoyo a Gestión de DAE.	Por definir	DAE	Desarrollo		
_							

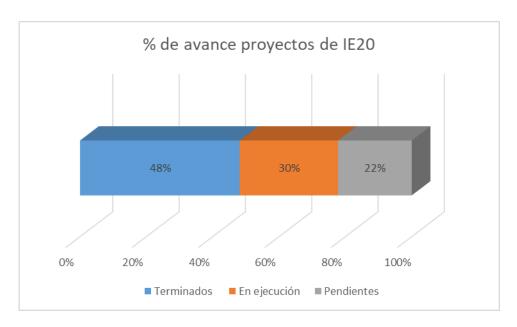

Nota: Proyectos terminados no figuran en este informe.

Dirección de Servicios Informáticos

Boletín Informativo Trimestral DSI Diciembre 2019

Página 4 de 13 Versión 3.0

2. OTROS PROYECTOS O INTERVENCIONES DE SISTEMAS

		FN FIFCUCIÓN

Pro	yectos:		Origen	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
1	Pago Web Estudiantes	Simplificar el proceso de pago, permitiendo el acceso a este desde el sitio web institucional, el cual puede ser utilizado por estudiantes o terceros.	VRAF	Desarrollo	Oseguel	Dic-18	Dic-19	92%
2	Firma electrónica contratos de prestación de servicios de honorarios docentes y no docentes.	Implementación de flujo de prestación de servicios (empresa ACEPTA).	DGP	Desarrollo GSA	Mtempio Scastillo Mmolina Mrozas	Ago-19	Por definir	20%
3	Sistematizar Boletín y Sitio Web de Normativa Institucional Universidad Católica de la Santísima Concepción.	Sitio web de tipo índice/buscador, que unifique y centralice información del tipo normativas institucionales, que permita consulta simultánea y remota (empresa externa).	Prorrectoría	Desarrollo	Mtempio Mmolina	Ago-19	Por definir	5%

2.2. PROYECTOS MENORES- EN EJECUCION.

Pro	yectos:		Origen	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada	Estado de avance
4	Monitoreo asignaturas para autoridades académicas.	Etapa 1: Herramienta reportes de avances de evaluaciones y asistencia.	Prorrectoría	Desarrollo	Jcomas Mvenegas	Jun-19	12-Nov	80%
		Etapa2: Habilitación en EVA de accesos para jefes de carreas.		GSAE	Oseguel	4-Nov	19-Nov	10%
5	Sistematizar Solicitud de Beneficios Trabajadores UCSC.	Permitir la solicitud de todos los Beneficios (21) vía solicitudes administrativas	DGP	GSA	Otobar Mbermedo	Ago-19	Oct-19	95%
6	Modificaciones al BIP	Incluir programación y control de avance.	VRAF	GSA	Fcordero	Ago-19	Oct-19	95%
7	CUBO: Información de Gestión para Facultades	Información de gestión Curricular y Docentes para Facultades (Cursos, Admisión, Publicaciones, CDA, etc.)	DGE	GSAE	Psierra	Mar-19	Dic-19	90%
8	Mantención Siscon - Registro de Actividades: Agregar productos de vinculación y carga de información histórica.	Agregar a los productos de vinculación nuevas preguntas, cargar información histórica, modificar comportamiento que permita la carga de la información histórica. Agregar a todos los productos los convenios.	VRVM	GSAE	Mrozas	Ago-19	Sep-19	95%
	Integración Sistema de Solicitud de Contrato	Realizar función de integración para que sean cargados los	Rectoría	GSA	Scastillo	Sep-19	Oct-19	80%



Página 5 de 13 Versión 3.0

	Docente con Ejecución Presupuestaria	Contratos docentes en el Compromiso de la Ejecución Presupuestaria						
10	Intervenciones al Portal de Empleos	Revisión completa de la aplicación, realizar mejoras al código.	DGP	GSA	Fcordero	Sep-19	Nov-19	55%
11	Mantención Módulo Formulación Presupuestaria	Realizar las adecuaciones y parametrizaciones, así como reabrir posibilidad de solicitud por mes	DF	GSA	Scastillo Jcabezas	Sep-19	Dic-19	100%
2	.3. PROYECTOS -PENDIENT	ES						
Pro	yectos:			Origen	Unidades DSI	RRHH DSI	Fecha inicio	Fecha término estimada
12	Mantención Siscon: Cambio de registro de actividades.	Principales actividades: - Cambiar el validadores de las act cargo. - Crear un mantenedor de produc - Interrelación con el CDA, respect dualidad áreas de tributación de u - Crear un reporte que permita vis información contenida en el ingre actividades. - Modificar la estructura del CDA poporte 3 años de compromiso. - Permitir evaluar un CDA mientra un nuevo compromiso.	tos. co de la in producto. ualizar la so de	UDA	GSAE	Mrozas	Oct-19	Dic-19
13	Mantención módulo Títulos Grados	y Agregar en el módulo de títulos y notas de diagnóstico y del ministe	_	DARA	GSAE	Psierra	Sep-19	Oct-19
14	Control de Cambios SENEGOCIA	Coordinar las actividades de pruel cambios solicitados a SENEGOCIA nuevas integraciones solicitadas		DF	GSA	Scastillo Mmolina	Sep-19	Nov-19
15	Nuevas funcionalidades Webdelfos	Realizar modificaciones y nuevas funcionalidades según solicitud de	FSCU.	FSCU	GSA	Mbermedo	Oct-19	Dic-19
16	Sistematizar Solicitud de Transporte	Permitir solicitar transporte vía so administrativas	licitudes	DO	GSA	Otobar	Oct-19	Por definir
17	Mantención módulo Guías de Despacho Electrónicas	Modificación de SAU, incorporar r documento tributario. Preparar fo según lo solicitado por SII		DF	GSA	Scastillo	Nov-19	Dic-19
18	Implementación Solicitud o Guías de Despacho	le Solicitud de Guías vía Solicitudes Administrativas.		DF	GSA	Mbermedo	Por definir	Por definir

Dirección de Servicios Informáticos

Boletín Informativo Trimestral DSI Diciembre 2019

Página 6 de 13 Versión 3.0

3. PRO	YECTOS DE INFRAESTRUCTURA T	1					
Proyectos:		Origen	Unidades DSI	RRHH	Fecha Inicio	Fecha Término Estimada	Estado de Avance
1 BIP-114	Implementar Herramienta Case (Adquisición y Capacitación).	IE20	GSA, Desarrollo, PT	Rmelo, Calarcón, Hsáez, Psierra, Etorres, Mmolina	Ene-19	Dic-19	100%
2 BIP-116	Renovación del parque de computadores institucionales por obsolescencia tecnológica.	IE21	РТ	Rmelo, Slemaria, Kvergara, Jmuñoz	Ene-19	Dic-19	100%
4 BIP-159	Licenciamiento (Software) para la operación normal de Facultades, Direcciones y Sedes de la UCSC.	DSI	PT	Rmelo	Ene-19	Dic-19	100%
5 BIP-210	Renovación proyector sala de teatro UCSC.	DGE	PT	Rmelo, Jmuñoz	Ene-19	Mar-20	90%
6 BIP-117	Servicio de procesamiento Y almacenamiento de datos en cloud para desarrollo de soluciones de modernización de sistemas	IE21	Desarrollo, PT	Rmelo, Hsaez, Castete Mmolina, Asilva	Ene-18	Dic-20	36%
7 BIP-225	Upgrade y ampliación central telefónica institucional.	DO	PT	Rmelo, Slemarie	Jul-19	Oct-19	100%
8 BIP-192	Ampliación de la Red de WIFI para reforzar las actividades académicas en Salas de clases.	Prorrector	РТ	Rmelo Hsáez, Slemarie	Ago-19	Nov-19	100%
9	Licitación servicio impresión	VRAF	PT	Rmelo	Sep-19	Abr-20	35%

Observaciones:

Bip-114: Unidad de Plataformas solo participó en la adquisición de licencias Power BI y en la organización de capacitación, cumplido 100% a diciembre de 2019.

BIP-117: Proyecto fue reformulado para periodo 2020, el nuevo código presentado y que está a la espera de su aprobación es BIP-263.

externalizado en la UCSC

Página 7 de 13 Versión 3.0

4.	R.R.H. DSI			
	SIGLA	NOMBRE	TIPO CONTRATO	CENTRO COSTO
1	Calarcon	Carlos Alarcón	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
2	Castete	Camilo Astete	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
3	Farcos	Fernando Arcos	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
4	Fcordero	Francisco Cordero	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
5	Hsaez	Hernán Sáez	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
6	Jcabezas	José Cabezas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
7	Jcomas	José Comas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
8	Jmuñoz	Javier Muñoz	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
9	Kvergara	Katherine Vergara	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
10	Mrozas	Miguel Rozas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
11	Mtempio	Mauro Tempio	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
12	Otobar	Omar Tobar	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
13	Psierra	Patricia sierra	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
14	Rmelo	René Melo	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
15	Rrodriguez	René Rodríguez	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
16	Scastillo	Sara Castillo	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
17	Slemarie	Sergio Lemarie	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
18	SRojas	Sebastián Rojas	Plazo indefinido	Dirección de Servicios Informáticos
19	ABascur	Antonio Bascur		
20	AVilla	Andrea Villa		
21	Icastro	Iván Castro		
22	Mfoulon	MichellL Foulon		
23	OPardo	Oriana Pardo		
24	Mbermedo	Matías Bermedo A.	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
25	Mcistena	Mauricio Cistena	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
26	Mvenegas	Maurio Venegas	Honorario	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
27	Cdellarossa	Carlo Dellarossa	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
28	Jrivera	José Rivera	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
29	Smendoza	Sebastián Mendoza	Pazo fijo	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
30	Asilva	Alejandro Silva	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
31	Mmolina	Manfredo Molina	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
32	Oseguel	Oscar Seguel	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión
33	Xsagredo	Ximena Sagredo	Plazo indefinido	Plan de Modernización de Sistemas de apoyo a la Gestión



Página 8 de 13 Versión 3.0

34	Amora	Ariel Mora	Pazo fijo	UCS 1899	
35	Jgamonal	Juan Gamoral	Pazo fijo	UCS 1899	

5. HITOS RELEVANT	ES		
HITO	DETALLE	BENEFICIO	FECHA
Participaron en encuentro internacional "Forum Educación Crestron"	Encuentro internacional en el que se muestran diferentes proyectos del ámbito mutimedial y que agrupa a representantes de universidades e instituciones educacionales de Latinoamérica	Reforzar conocimientos en tecnología multimedial para la educación, lo que les ofrece la posibilidad de visualizar de mejor forma proyectos actuales y futuros en esta índole.	Nov-2019

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS TE	CNOLÓGICOS:		ANCO DE BANDA CONTRAT	TADO-	
Correo	100%		Alámbrica	Nacional 400 I	Mhne
Servidores	100%				
Base de Datos	100%		Inalámbrica	Internacional 200 I	
Plataforma de red	99,94%		inalambrica	Nacional 400 I	
internet	99,81%		(Mbps Mega bit por segundo /	Internacional 800 I	Mbps
WIFI	100%		(IVIDPS IVIEGA DIT POT SEGUNDO /	rasa transferencia 1:1)	
Mpls (enlace a sedes)	100%	Zonos con	* 7agas con cohorturas n	or Facultad on Campus	Con
Mpls (enlace a sedes) CONECTIVIDAD WIFI:	100%	Zonas con cobertura	* Zonas con coberturas p Andrés	or Facultad en Campus	
CONECTIVIDAD WIFI:	100% San Andrés		Andrés	or Facultad en Campus Facultad de Ciencias	San 16
CONECTIVIDAD WIFI:	San Andrés	cobertura	Andrés	·	
CONECTIVIDAD WIFI: Campus . Campus Sant	San Andrés	cobertura 166*	Andrés	Facultad de Ciencias FACEA	16
CONECTIVIDAD WIFI: Campus . Campus Sant	San Andrés to Domingo ede Cañete	cobertura 166* 13	Andrés Fac. de Comunicación, H	Facultad de Ciencias FACEA	16 14
CONECTIVIDAD WIFI: Campus Campus Sant S Sede Chillán (incluy	San Andrés to Domingo ede Cañete	cobertura 166* 13 12	Fac. de Comunicación, H	Facultad de Ciencias FACEA Historia y Cs. Sociales	16 14 13
CONECTIVIDAD WIFI: Campus Campus Sant S Sede Chillán (incluy	San Andrés to Domingo ede Cañete ve Hospital) Los Ángeles	cobertura 166* 13 12 17	Fac. de Comunicación, H	Facultad de Ciencias FACEA Historia y Cs. Sociales acultad de Educación	16 14 13 31

Página 9 de 13 Versión 3.0

Primer Semestre:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Comprometido	6.504.438	12.675.161	14.089.202	22.376.443	27.066.205	34.794.971	33.589.115
Pagado	901.126	901.126	12.675.161	15.926.156	23.277.566	26.243.485	28.399.619
Segundo Semestre:	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Comprometido	37.198.969	37.198.969	134.194.772	168.182.395	179.061.211		
Pagado	28.399.619	34.278.898	34.278.898	44.777.597	140.570.288		
Acumulado mensual, Inform	e Presupuestario	de Sistema de Ejed	cucion Presupue:	staria)			
CASILLAS DE CORREOS II	NSTITUCIONAL:			TELEFONÍ	A:		
		N∘					Nο
ON STEEL IS DE COMMECCO II		2.619			Teléfonos	IP .	344
	Funcionarios	2.019					
0,012,002	Funcionarios Alumnos *	40.449	_	Т	Γeléfonos Digita	les	111

Error en a	cceso a Portal institucional	Sep-19		Sep-20	Encurso
NC Lentitud en lace WIFI institucional		Ago-19		Marzo	En curso
		Inicio		Término	Estado
. Alc		Fecha		Fecha	E I
PRODUCTOS/SERVICIOS NO CONFORMES:					
	unidad de desarrollo de siste	errias).			
Falta de personal con dedicación exclusiva.	Modificación de estri organizacional DSI (conforn	nación	Nov-17	Mar-20	En curso
Riesgo	Acción		Fecha Inicio	Fecha Término	Estado
PLAN PARA ABORDAR LOS RIESGOS DE LOS	PROCESOS:				
Versión 2.0 intranet UCSC (po	rtal alumnos y funcionarios).	Ago	-17	May-19	Terminado
Oportunidad		Inic		Término	Estado
PLAN DE ACCIÓN DE OPORTUNIDADES:		Fec	ha	Fecha	
7. SISTEMA GESTIÓN DE CALIDA	D				

Página 10 de 13 Versión 3.0

8. SOFTWARE CON LICENCIA CORPORATIVA	
	Unidad
1 LICENCIA DE SQL SERVER STD	Dirección de Servicios Informáticos
2 ANSYS ACADEMIC RESEACH HPC	Adm Facultad de Ingeniería
20 SOFTWARE WINDOWS 7	Proy.Mecesup USC 1101
4 RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER	Dirección de Servicios Informáticos
4 WINDOWS 8 OEM	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011
7 HOBO PENDANT TEMP 64K	Administración CREA
ACADEMIC BASIC SUPPORT	Dirección de Servicios Informáticos
ACADEMIC VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS KIT	Proy.Mecesup USC1105
ACTUALIZACION SISTEMA ECONOMATICA	Unidad por Distribuir
ADMINISTRATIVE FEES LICENSE	Adm Facultad de Ingeniería
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 11 MULT. PLATAFORMS	Proy. Mecesup USC 0807
ADOBE CS6 DESIGN AN WEB PREM 6	Proy.Mecesup USC 1103
ALL APPS MULTIPLE PLATFORMS	Adm Facultad de Ingeniería
ANIMATE CC/FLASH PROFESSIONAL CC ALL MP EDUCATION NAMED LICENS	FAD 15/2016
ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL	Dirección de Servicios Informáticos
ANSYS ACADEMIC RESEACH MECHANICAL AND CFD	Adm Facultad de Ingeniería
APPLE DEVELOPER PROGRAM	Dirección de Servicios Informáticos
ARTELYS KNITRO ALMS LICENSE COVERED	Adm Facultad de Ingeniería
CORMIX 9.0 GTD-SINGLE COMPUTER LICENSE	Minera Escondida
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL	Adm Facultad de Ingeniería
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
ECONOMATICA	Adm. Facultad de Economía
EDUCATIONAL PLAXIS 2D FLEXIBLE	Adm Facultad de Ingeniería
FIRST YEAR MATH WORKS SOFTWARE MAINTENANCE SERVICE	Adm Facultad de Ingeniería
IBM SPSS STATISTIC VS. 21 USUARIOS	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011
IBM SPSS STATISTICS BASE	DIN 12/2014
IMPLEMENTACION MODULO	Fondos Propios.
KSS TECHTRACS CHILE BASIC VERSION SOFTWARE AND SERVICES	Conicyt: Inserción de capital Humano Avanzado
MALTAB BASE 20 USUARIOS	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB MAINTENANCE SUBML	Adm Facultad de Ingeniería
MATLAB REINSTATEMENT SRML	Adm Facultad de Ingeniería
MICROSOFT WINDOWS 7 STARTER OEM 32 BIT	Proy.Mecesup USC 1101
MS OEM WIN 8/64B SPA 1PK(SINGLE LANGUAGE)	Fondo de Fortalecimiento CRUCH 2011



Página 11 de 13 Versión 3.0

ORDCAD SECURITY DONGLE	Proy.Mecesup USC 1101
ORDCAD SIMULATION UNIVERSITY EDITION	Proy.Mecesup USC 1101
PIX4DMAPPER PRO EDUCATIONAL	Adm Facultad de Ingeniería
PLATAFORMA DE VIGILANCIA	Mascott Multilateral Association for Studying
PLATAFORMA DOCODE	Dirección de Servicios Informáticos
PLATAFORMA LEGALPUBLISHING CHECKPOINT BSUB	Proy.Mecesup BIBLIOTECA USC 1405
PLATAFORMA READSPEAKER ENTERPRISE	FDI 01/2015
PLATAFORMA READSPEAKER SALDO RESTANTE	FDI 01/2015
PLAXIS VIP FOR PLAXIS 2D EDUCATIONAL 12 MONTHS	Adm Facultad de Ingeniería
POSTAGE AND HANDLING	Adm Facultad de Ingeniería
PRINT MANAGER PLUS ENTERPRISE EDITION ACADEMIC	Adm. Facultad de Educación
PROGRAMA DE SERVICIO ESTANDAR LABORATORIO ACADEMICO	Adm Facultad de Ingeniería
PSIM EDUCATION PRO	Adm Facultad de Ingeniería
PSIM PRO PACKAGE 30-USER NETWORK	Adm Facultad de Ingeniería
RAPIDSSL WILDCARDS 2	Dirección de Servicios Informáticos
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD	Dirección de Servicios Informáticos
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVERENTRY LEVEL	Dirección de Servicios Informáticos
ROSSCIENCE EDUCATION PROGRAM 2016	Adm Facultad de Ingeniería
SAP2000 V18 EDUCACIONAL	Adm Facultad de Ingeniería
SC D3D EDUC SP DELFT 3D FM EDUCATIONAL SERVICE	Doctorado en Ingeniería Civil
SHARE POINT SERVER	Dirección de Servicios Informáticos
SHIPPING USA-CHILE	Proy.Mecesup USC 1101
SOFTWARE ACADEMIC BASIC SUPPORT	Proy.Mecesup USC1105
SOFTWARE ACADEMICO	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS 2050 LICENCIAS GDATA ENDPOINT SECURITY	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS DERECHOS DE ACTUALIZACION	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE ANTIVIRUS UPGRADE BUSINESS	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE COMMERCIAL LICENSE JQUERY	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE CYBER ANATOMY 3D	Adm Facultad de Medicina
SOFTWARE DE NAVEGACION PANTALLAS TOUCH	Dirección de Difusión
SOFTWARE INTEL FORTRAN COMPOSER XE	Conicyt: Inserción de capital Humano Avanzado
SOFTWARE ITEMIZAR 120 LICENCIAS EDUCACIONALES	Proy.Mecesup PM USC 1308
SOFTWARE MAQUINAS RELOJES	Dirección de Gestión del Personal
SOFTWARE PSICOFAST EDUCACION	Adm Facultad de Medicina
SOFTWARE RAPIDSSL WILDCARD CERTIFICATES 2 AÑOS	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE SAP HOSTING FREE 1 AÑO	Unidad por Distribuir
SOFTWARE SAS EDUCATION ANALYTICAL SUITE EAS	Adm Facultad de Ingeniería



Página 12 de 13 Versión 3.0

OFTWARE STEP 7 BASIC SIEMENS PLC	Proyecto Construcción Capilla Cañete
SOFTWARE UPDATE LICENCE & SUPPORT	Dirección de Servicios Informáticos
SOFTWARE WINDOWS 8	Administración Sede Los Ángeles
SOFTWARE WINDOWS STARTER	Renovación equipamiento computacional institucional
SOFWARE WIN8 OEM (3)	Adm. Facultad de Derecho
SPSS STATISTICS SMART PACK	Unidad por Distribuir
STATA SE V14 ACADEMICA 5 USER ESPAÑOL PERPETUA ELECTRONICO	Adm. Facultad de Economía
STATISFIX 10 UPGRADE 30-PC NETWORK	Adm. Facultad de Ciencias
SYMBOLIC MATH TOOLBOX 20 USUARIOS	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX MAINTENANCE SUBSM	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX REINSTATEMENT SRSM	Adm Facultad de Ingeniería
SYMBOLIC MATH TOOLBOX SMALL	Adm Facultad de Ingeniería
T&C AVAILABLE AMPL ALMS LICENSE COVERED	Adm Facultad de Ingeniería
TRANSYT 15 VERSION NETWORK 20	Adm Facultad de Ingeniería
VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD FOR VMWARE UPGRADE FROM VEEAM	Dirección de Servicios Informáticos
VEEM BACKUP	Dirección de Servicios Informáticos
VIRTUALIZACION DIPLOMADO	Fondos Propios.
WINDOWS 7 PRO 64 SPANISH	Administración Sede Los Ángeles
WINDOWS 8 OEM	Adm Facultad de Comunicaciones

Página 13 de 13 Versión 3.0

9. GLOSA	
SIGLA	DESCRIPCIÓN
CEADE	Centro de Acompañamiento del Estudiante
DAE	Dirección de Apoyo Estudiantil
DARA	Dirección de Admisión y Registro Académico
DD	Dirección de Docencia
Desarrollo	Unidad de Desarrollo de Sistemas
DF	Dirección de Finanzas
DGP	Dirección Gestión de Personal
DII	Dirección de Investigación e Innovación
DO	Dirección de Operaciones
DSI	Dirección de Servicios Informáticos
FSCU	Fondo solidario de Crédito Universitario
GSA	Unidad de Gestión de Sistemas Administrativos
GSAE	Unidad de Gestión de Sistemas Académicos Estudiantiles
IE20	Iniciativa Estratégica N° 20
IE21	Iniciativa estratégica N° 21
PACED	Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior
PDE	Plan de Desarrollo Estratégico Institucional
PMI	Plan de Mejora Institucional para la Reacreditación
PT	Unidad de Plataformas Tecnológicas
UDA	Unidad de Desarrollo Académico
VRA	Vicerrectoría Académica
VRAF	Vicerrectoría de Administración y Finanzas
VRVM	Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
